


Риски реализации муниципальных проектов с участием населения

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН: Д.Э.Н., ПРОФЕССОРОМ Г.ЛАПУШИНСКОЙ
(ТВЕРЬ),

E-MAIL: LABORATORY-REGION@YANDEX.RU

Участие населения в решении вопросов местного значения

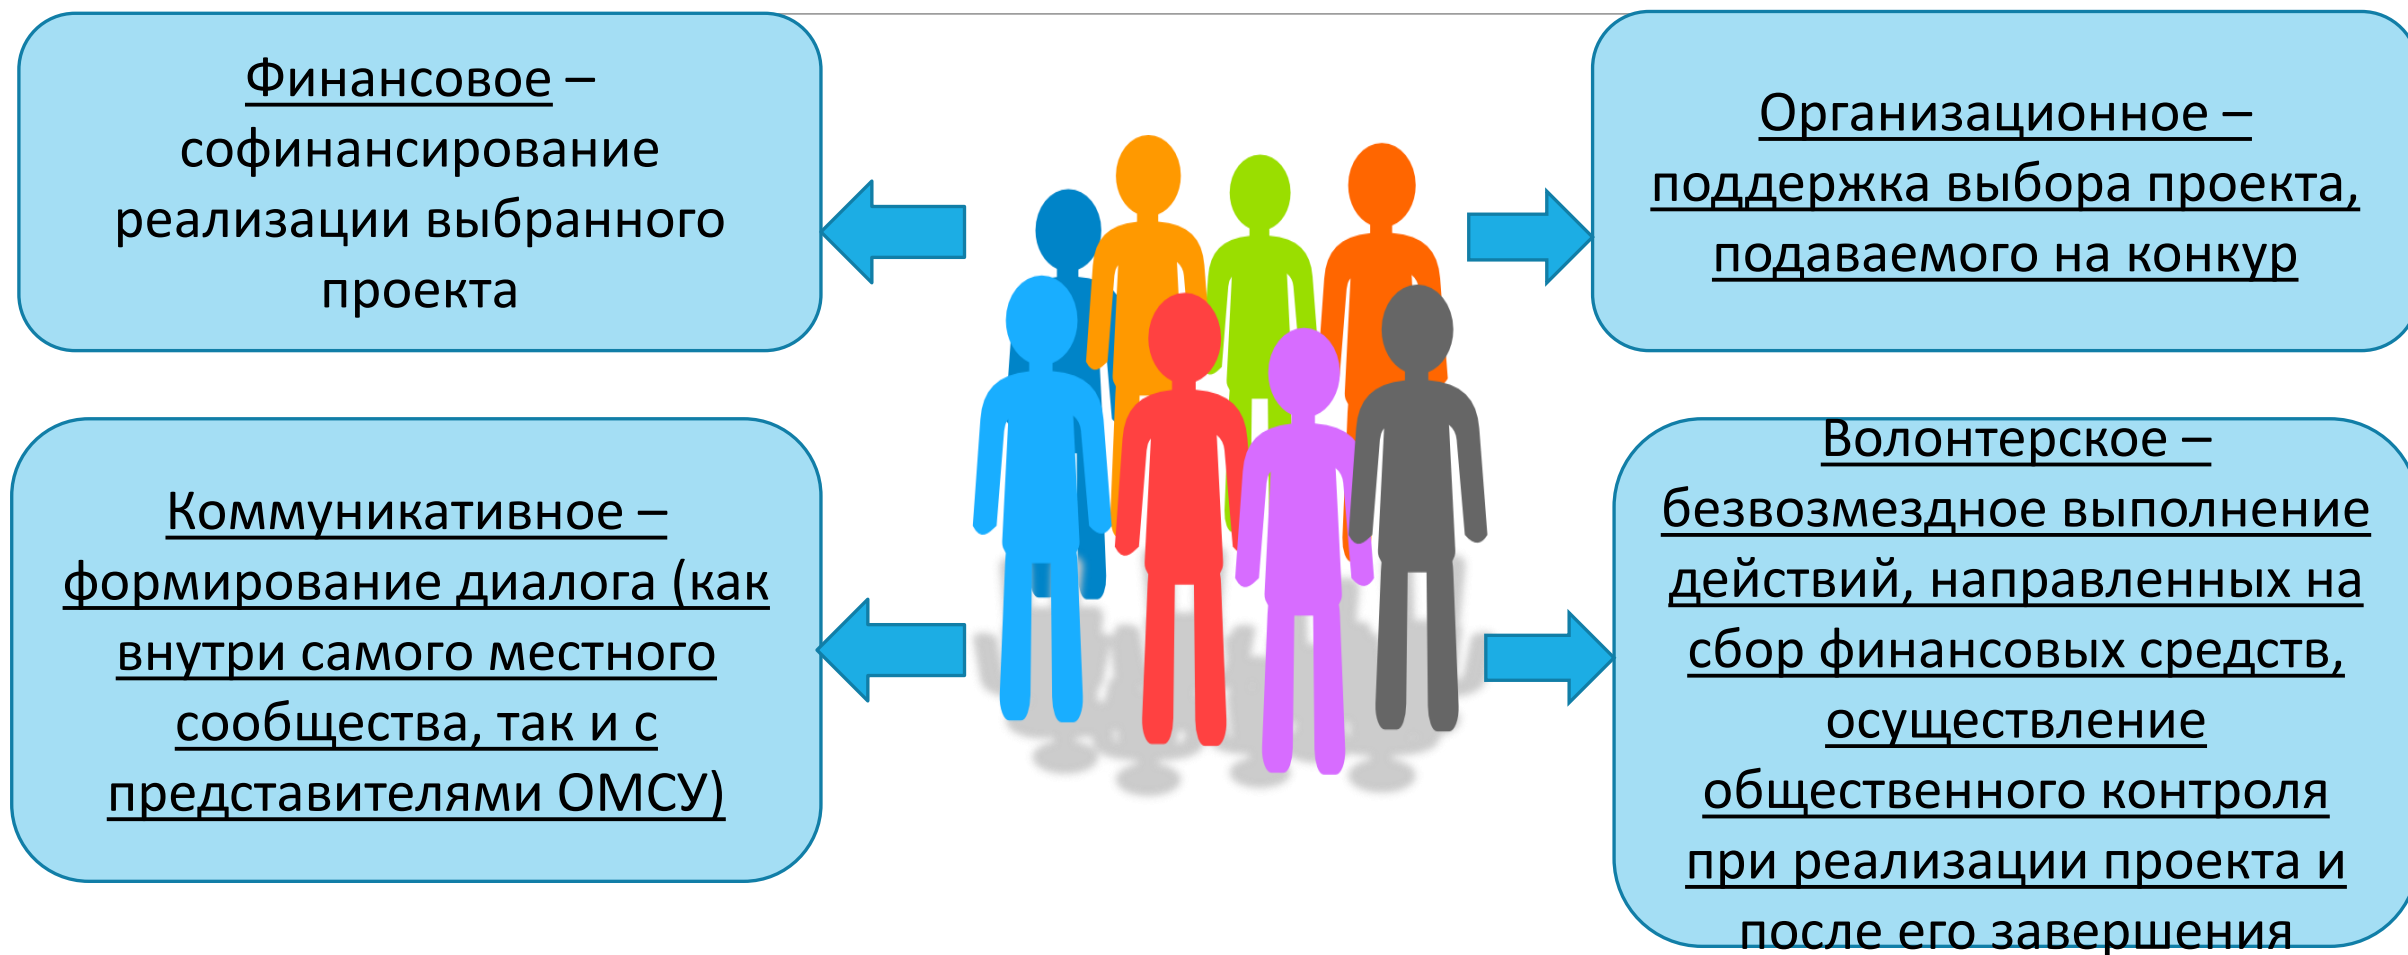

Финансовая поддержка – региональные субсидии на реализацию совместных проектов, предоставляемые муниципалитетам на конкурсной основе

- Определяет
- наиболее приоритетную проблему местного уровня (в рамках полномочий ОМСУ)
- возможности софинансирования со стороны населения
- Избирает инициативную группу

Население
(собрание)/инициативная группа

ОМСУ

- Организует процесс вовлечения населения в решение вопросов местного значения
- готовит конкурсную заявку, в т.ч. техническую документацию (вместе с инициативной группой)
- проводит конкурсный отбор подрядчиков и реализует проект до конца года

- оценивает проекты по утвержденным критериям и определяет победителей
- заключает соглашения с победившими МО и предоставляет им субсидии

Региональная конкурсная комиссия
/Уполномоченное министерство

- Техническое сопровождение – информирование, **обучение**, непосредственные консультации, мониторинг и т.д.

Риски, которые должно знать население

1. Предпроектные риски («не окупаемые» или «не гарантированно окупаемые» затраты) МО

Затраты на подготовку проектно-сметной документации/Оформление технического паспорта

Прием в муниципальную собственность бесхозного имущества (увеличение последующих затрат на содержание и эксплуатацию)



Процедурные риски при выборе проекта

- ➔ Больше число участников собрания – больше баллов в конкурсе,
 - но меньшее количество проектов;
 - но сложности в проведении собрания (нет площадки для сбора, нет транспорта для доставки людей).
- ➔ Использование при отборе критерия «доля участия населения», а не финансовая нагрузка.
- ➔ «Выбор без выбора» (значимые для населения проекты могут не проходить по критериям конкурса)
 - недостаточный процент благополучателей (проекты для малонаселенных пунктов)
 - на собрание выносятся только проекты, которые подготовлены технически и поддерживаются администрацией (например, исходя из будущих затрат на обслуживание или финансовых возможностей местного бюджета)



Риски участия в конкурсе



Если не победить в конкурсе, то:

- ⇒ готовность участвовать в будущем (??);
- ⇒ доверие населения к власти (??).




Перекус в выборе населенного пункта, где будет реализовываться проект:


- ⇒ легче реализовать проект там, где уже был успешный опыт участия в ППМИ;
- ⇒ выбор более крупных населенных пунктов, исходя из критериев конкурса.



Предоставление гарантийных писем о будущем софинансировании (возможное изменение ситуации у компании и отсутствие этого источника в реальности).



Планирование расходов на ППМИ в местном бюджете: может быть не обеспечено поступлениями в бюджет из-за проблем у компаний на территории



Большое число заявленных проектов на неизменную сумму средств в региональном бюджете:

- ⇒ необходимость закладывать большую финансовую нагрузку на население (значительно больше 5%);
- ⇒ увеличение количества не прошедших проектов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

